




Finanzierungsvorschlag für die Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung

Ziel Vertragsabschluss vor Erhalt des Zuwendungsbescheides (ZWB) (Stand 28.05.21)

Kosten	Kostenberechnung		ZWB (Annahme)		Anteil VRS		DB Station&Service	
	in Mio. EUR	in %	in Mio. EUR	in %	in Mio. EUR	in %	in Mio. EUR	in %
GWU	4,77	100%	2,64	55%	1,65	35%	0,48	10%
Baukosten	3,53		2,29	65% der Baukosten				
Planungskosten	1,24	35%	0,34	15% zwf. Baukosten (Carona Regelung LGVFG in 2021)				

VERTEILUNG BEI KOSTENERHÖHUNGEN

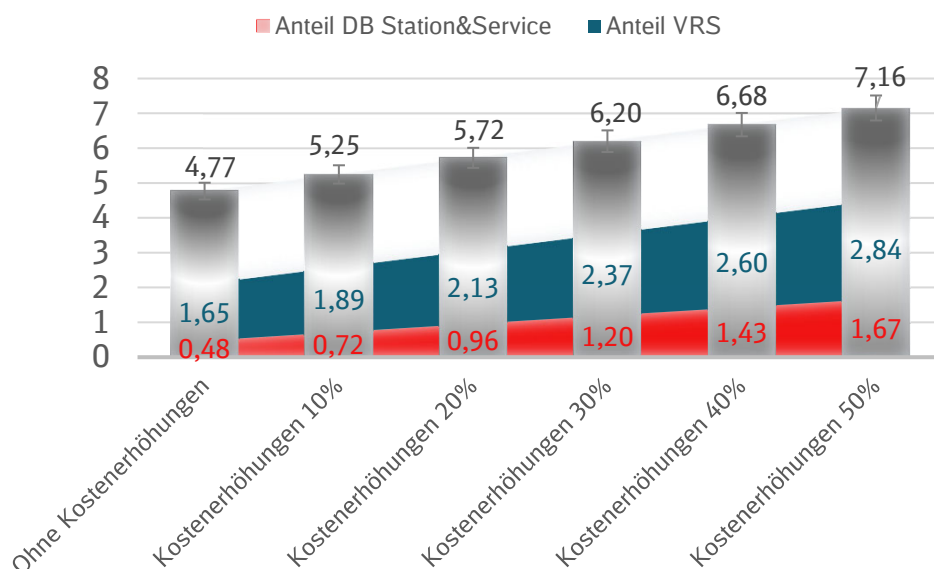

ZUSAMMENFASSUNG:

- Durch den Abschluss eines RuFV Lph. 5-9 vor Erhalt des ZWB kann eine **Zeitersparnis von 3-6 Monaten** pro Projekt erreicht werden
- Beteiligung **DB Station&Service** an den Gesamtkosten bereits bei Abschluss des Realisierungs- und Finanzierungsvertrages (RuFV) in Höhe von 10%
- **Kostenerhöhungen bis zu 50%** im Projekt ab der Lph. 5 werden gemeinsam je zur Hälfte von **DB Station&Service und dem VRS** getragen
- **Übersteigende Kosten über 50%** werden von DB Station&Service getragen
- **Möglichkeit** des Projektabbruches oder **-verschiebung** bei Kostenerhöhungen **über 50%**
